

标识号	0	任务模式	任务名称	3	工期		开始时间		完成时间		前置任务		资源名称
		*	启动		5 个工作日		2020年1	1月9日	2020年11	月13日			
2	ŧ		启动	核心团队	1 个工作日		2020年1	1月9日	2020年11	月9日			项目经理,UI专家
3	ŧ	-5	干系	人分析	1 个工作日		2020年1	1月9日	2020年11	月9日			项目经理
4	6	-5	里程	碑计划	1 个工作日		2020年1	1月9日	2020年11	月9日			项目经理
5		-5	制定	项目章程	1 个工作日		2020年1	1月12日	2020年11	月12日	2,3,4		项目经理
6	III		项目	启动大会	1 个工作日		2020年1	1月13日	2020年11	月13日	5		项目经理,需求专家
7		*?	规划										
8		9	规划	范围	4 个工作日		2020年1	1月30日	2020年12	月3日			
	Ⅲ †	-9	制	定需求说明书	1 个工作日		2020年1	1月30日	2020年11	月30日	6		需求专家
10	Ⅲ †	4	界间	面设计	1 个工作日		2020年1	2月1日	2020年12	月1日	9		UI专家
11			详	细设计说明书	1 个工作日		2020年1	2月1日	2020年12		9		设计专家
12	Ť	-5	项	目范围说明书	1 个工作日		2020年1	2月1日	2020年12	月1日	9		项目经理
13	Ť	-5		建WBS	1 个工作日		2020年1	2月2日	2020年12	月2日	10,11,12		项目经理
14	Ť	-5	形	成范围基准	1个工作日		2020年12	月3日	2020年12月	3日	13		项目经理
15		-5	规划	时间	5 个工作日		2020年12	月4日	2020年12月	10日			
16	Ť	-5	排	列工作包顺序	1个工作日		2020年12		2020年12月		14		项目经理
17	İ	-5		算资源	1个工作日		2020年12		2020年12月		16		项目经理
18	İ	-5		算持续时间	1个工作日		2020年12		2020年12月		17		项目经理
19	•	-5		定进度计划	1个工作日		2020年12		2020年12月		18		项目经理
20	Ť	-9		成进度基准	1个工作日		2020年12		2020年12月		19		项目经理
21		-5	规划	· ·	3个工作日		2020年12		2020年12月				
22	•	-5	项	目成本估算	1个工作日		2020年12	月11日	2020年12月	11日	20		项目经理
				Task		Inactive S	ummary			External Ta	asks		
				Split		Manual Ta	ask			External M	lilestone	\Diamond	
				Milestone	♦	Duration-	only			Deadline		•	
•		体基因组注	E释 .mp	Summary		Manual Si	ummary Rollu	ир		Progress			
Date: 2	2020年	12月8日		Project Summary		Manual Si			1	Manual Pr	ogress		
				Inactive Task		Start-only		Е					
				Inactive Milestone	\Diamond	Finish-onl	у	3					
							Page 1						

标识号	A	任务模式	任务名称	R	工期	J	开始时间		完成时间		前置任务		资源名称
23	Ť	-5	项	目预算	1个工作日	2	2020年12月	12日	2020年12月	12日	22		项目经理
24	ŧ	-5	形	成范围基准	1个工作日	2	2020年12月	13日	2020年12月	13日	23		项目经理
25		-9	规划	质量	2个工作日	2	2020年12月	34日	2020年12月	7日			
26		-9	制	定测试计划	1个工作日	2	2020年12月	4日	2020年12月	4日	14		质量专家
27		9	制	定测试用例	1个工作日	2	2020年12月	7日	2020年12月	7日	26		质量专家
28		-5	规划	人力资源	2 个工作日	2	2020年12月	18日	2020年12月	9日			
29	ŧ	-9	制	定人力资源计划	1个工作日		2020年12月		2020年12月	8日	17		项目经理
30	ŧ	-9	制	定人员配备管理计划	1个工作日	2	2020年12月	9日	2020年12月	9日	29		项目经理
31		-5	规划	沟通	1个工作日		2020年12月		2020年12月				
32	i	-9		定沟通管理计划	1个工作日		2020年12月		2020年12月		30		项目经理
33	_	-9	规划		2个工作日		2020年12月		2020年12月				
34	Ť	-9		制外购分析	1个工作日		2020年12月		2020年12月		17		项目经理
35	Ť	-9		定采购文件	1个工作日		2020年12月		2020年12月		34		项目经理
36	_	-9		风险	3 个工作日		2020年12月		2020年12月				
37	Ť	-9		别风险	1个工作日		2020年12月		2020年12月		15,21,25,	28	项目经理
38		-9		险分析	1个工作日		2020年12月		2020年12月		37		项目经理
39		-5		定风险登记册	1个工作日		2020年12月		2020年12月		38		项目经理
40		-5	规划		1个工作日		2020年12月		2020年12月		39		项目经理
41		-5	执行与		13 个工作日		2020年11月		2020年12月				
42	•	-5		项目团队	1个工作日		2020年11月		2020年11月		7		项目经理,测试员1
43		-5	项目		10 个工作日		2020年11月		2020年12月				
44		-5	用	户模块 	6个工作日	2	2020年12月	1日	2020年12月	8日			
				Task		Inactive Su	mmary		l E	xternal Ta	sks		
				Split		Manual Tas	sk		E	xternal M	lestone	\Diamond	
				Milestone	>	Duration-o	nly			Deadline		•	
,		立体基因组注	E释 .mp	Summary	——	Manual Su	mmary Rollup		P	Progress			
Date: 7	2020 ¹	年12月8日		Project Summary		Manual Su	mmary			Manual Pro	gress		
				Inactive Task		Start-only	-	Е					
					>	Finish-only		3					
							Page 2						

标识号	A	任务模式	任务名称	ĸ	工期		开始时间		完成时间		前置任务	ī	资源名称	(
45	Ĭ	-5		注册登录	2 个工作日		2020年12	月1日	2020年12	月2日	42		程序员	1
46	ŧ	-5		首页	1个工作日		2020年12	月3日	2020年12	月3日	45		程序员	1
47	ŧ	-9		输入内容	2个工作日		2020年12	月4日	2020年12	月7日	46		程序员	2
48		-9		查看结果	1个工作日		2020年12	月8日	2020年12	月8日	47		程序员	2
49		-5	管	理员模块	3个工作日		2020年11	月30日	2020年12	月2日				
50	ŧ	-9		审核注册用户	1个工作日		2020年11	月30日	2020年11	月30日			测试员	1
51	ŧ	-9		用户数据库管理	2个工作日		2020年11	月30日	2020年12	月1日			程序员	1,程序员2
52	ŧ	9	:	基因数据库管理	3个工作日		2020年11	月30日	2020年12	月2日			程序员	1,程序员2
53	ŧ	-5		审核商家广告	1个工作日		2020年12		2020年12	月1日	62		项目经	理
54	ŧ	-5		播放广告	1个工作日		2020年12		2020年12	月1日	62		测试员	1,测试员2
55	_	-5		部实现模块	10 个工作日		2020年11		2020年12					
56	İ	-5		收集数据	2个工作日		2020年11	月30日	2020年12	月1日			需求专	家
57	İ	-5		数据过滤	2个工作日		2020年12		2020年12		56		程序员	1
58	İ	-5		基因组装	2个工作日		2020年12	月4日	2020年12	月7日	57		程序员	2
59		-5		基因注释	2个工作日		2020年12	月8日	2020年12	月9日	58		程序员	1
60		-9		基因可视化	2个工作日		2020年12	月10日	2020年12	月11日	59		程序员	2
61		-9		家模块	1个工作日		2020年11		2020年11					
62	Ť	-9		发布广告	1个工作日		2020年11		2020年11				测试员	1
63	_	*	项目		12 个工作日		2020年12		2020年12					
64	Ť.	-5		项指标监控	7个工作日		2020年12		2020年12		42			1,项目经理
	■ †	-5		控评审	4个工作日		2020年12		2020年12		64			家,项目经理
66	III	-5	变	更评审	1个工作日		2020年12	月14日	2020年12	月14日			设计专	家,项目经现
				Task		Inactive S	ummary			External T	asks			
				Split		Manual T	ask			External N	Milestone	\Diamond		
				Milestone	♦	Duration-	only			Deadline		•		
•		体基因组注	释 .mp	Summary		Manual S	ummary Rollu	ір		Progress				
Date: 7	2020年	三12月8日	Project Summary			Manual S	•			Manual P	rogress			
				Inactive Task		Start-only	-	Е			-			
				Inactive Milestone	\Diamond	Finish-on		3						
							Page 3							

示识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
67	•	-5	管理干系人	6 个工作日	2020年12月1日	2020年12月8日		
68	ŧ	-5	发布项目信息	6个工作日	2020年12月1日	2020年12月8日	42	项目经理
69	ŧ		报告监控指标	5个工作日	2020年12月1日	2020年12月7日	42	项目经理
70	ŧ	-5	干系人沟通	6个工作日	2020年12月1日	2020年12月8日	42	项目经理
71		-5	团队建设	2个工作日	2020年11月30日	2020年12月1日		
72	ŧ	-5	培训	1个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	42	UI专家,测试员1,测
73	ŧ	-5	娱乐活动	1个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	42	UI专家,测试员1,测
74	ŧ	-5	沟通	1个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	42	UI专家,测试员1,测
75	ŧ		采购	1个工作日	2020年11月30日	2020年11月30日		需求专家
76	III		项目验收	1个工作日	2020年12月12日	2020年12月12日	43	UI专家,设计专家
77		*	收尾	7个工作日	2020年12月8日	2020年12月14日		
78			项目终验	1个工作日	2020年12月8日	2020年12月8日		UI专家,设计专家
79	ŧ	-5	项目采购	1个工作日	2020年12月13日	2020年12月13日	76	项目经理
80		-5	项目内部收尾	2个工作日	2020年12月13日	2020年12月14日	76	UI专家,测试员1,测



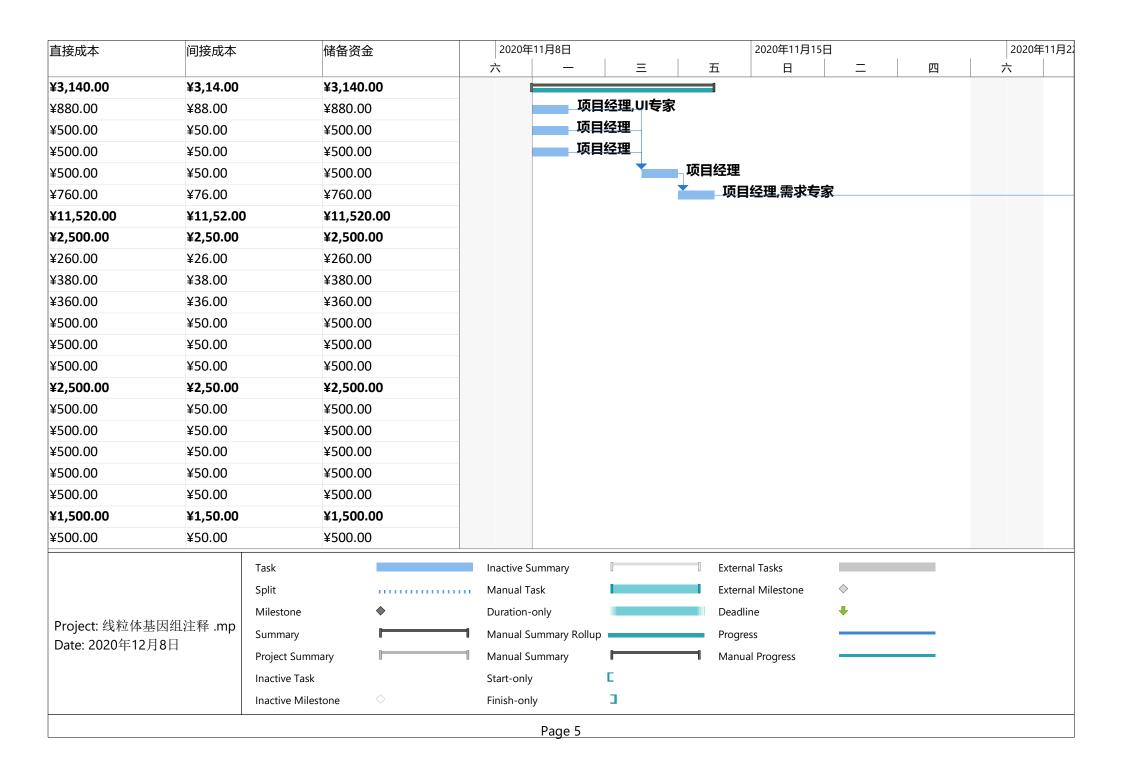

直接成本	间接成本	储备资	金	2020年11	月8日			2020年11月15日				2020年11月22		
				六	_	Ξ	五	日	=	四	六			
¥500.00	¥50.00	¥500.	00											
¥500.00	¥50.00	¥500.	00											
¥520.00	¥52.00	¥520.	.00											
¥260.00	¥26.00	¥260.	00											
¥260.00	¥26.00	¥260.	00											
¥1,000.00	¥1,00.00	¥1,00	0.00											
¥500.00	¥50.00	¥500.	.00											
¥500.00	¥50.00	¥500.	00											
¥500.00	¥50.00	¥500.	.00											
¥500.00	¥50.00	¥500.	00											
¥1,000.00	¥1,00.00	¥1,00	0.00											
¥500.00	¥50.00	¥500.	00											
¥500.00	¥50.00	¥500.	00											
¥1,500.00	¥1,50.00	¥1,50	0.00											
¥500.00	¥50.00	¥500.	00											
¥500.00	¥50.00	¥500.	00											
¥500.00	¥50.00	¥500.	00											
¥500.00	¥50.00	¥500.	.00											
¥28,580.00	¥28,58.00	¥28,5	80.00											
¥760.00	¥76.00	¥760.	00											
¥11,130.00	¥11,13.00	¥11,1	30.00											
¥2,460.00	¥2,46.00	¥2,46	0.00											
		Task		Inactive Sum	mary		Exterr	nal Tasks						
		Split		Manual Task			Extern	nal Milestone	\Diamond					
		Milestone	♦	Duration-onl	y		Deadl	ine	•					
Project: 线粒体基	•	Summary	——	Manual Sum	mary Rollup		Progre	ess						
Date: 2020年12月	8	Project Summary		Manual Sum			_	al Progress						
		Inactive Task		Start-only		Е								
		Inactive Milestone	\Diamond	Finish-only		3								
	l .			D	age 6									

直接成本		储备资金		2020年11月8	7 L			2020年11月	月15日		2020年11月22	
				六	_	Ξ	五	日	=	四	六	
¥820.00	¥82.00	¥820.00										
¥500.00	¥50.00	¥500.00)									
¥710.00	¥71.00	¥710.00)									
¥430.00	¥43.00	¥430.00)									
¥4,930.00	¥4,93.00	¥4,930.	00									
¥260.00	¥26.00	¥260.00)									
¥1,530.00	¥1,53.00	¥1,530.	00									
¥2,130.00	¥2,13.00	¥2,130.	00									
¥500.00	¥50.00	¥500.00)									
¥510.00	¥51.00	¥510.00)									
¥3,480.00	¥3,48.00	¥3,480.	00									
¥420.00	¥42.00	¥420.00)									
¥820.00	¥82.00	¥820.00)									
¥710.00	¥71.00	¥710.00)									
¥820.00	¥82.00	¥820.00)									
¥710.00	¥71.00	¥710.00)									
¥260.00	¥26.00	¥260.00)									
¥260.00	¥26.00	¥260.00)									
¥7,040.00	¥7,04.00	¥7,040.	00									
¥3,640.00	¥3,64.00	¥3,640.	00									
¥2,540.00	¥2,54.00	¥2,540.	00									
¥860.00	¥86.00	¥860.00)									
		Task		Inactive Summa	ary] E	External Tasks				
		Split		Manual Task			E	External Milestone	\Diamond			
		Milestone	♦	Duration-only				Deadline	•			
Project: 线粒体基因组织		Summary		Manual Summa	ary Rollup		F	Progress				
Date: 2020年12月8日	∃	Project Summary		Manual Summa				Manual Progress				
		Inactive Task		Start-only		С		-				
		Inactive Milestone	\Diamond	Finish-only		3						
				Pad	ge 7							

直接成本	间接成本	储备资金	2020年	2020年11月8日					2020年11月15日			
			六	_	Ξ	五	日	=	四	六		
¥5,980.00	¥5,98.00	¥5,980.00										
¥2,100.00	¥2,10.00	¥2,100.00										
¥1,780.00	¥1,78.00	¥1,780.00										
¥2,100.00	¥2,10.00	¥2,100.00										
¥2,930.00	¥2,93.00	¥2,930.00										
¥890.00	¥89.00	¥890.00										
¥890.00	¥89.00	¥890.00										
¥890.00	¥89.00	¥890.00										
¥260.00	¥26.00	¥260.00										
¥740.00	¥74.00	¥740.00										
¥2,690.00	¥2,69.00	¥2,690.00										
¥740.00	¥74.00	¥740.00										
¥500.00	¥50.00	¥500.00										
¥1,450.00	¥1,45.00	¥1,450.00										

